



Lieferwerk:

Viatop AG


Prüfstelle: BLZ Baulabor Zentralschweiz AG

Walzasphalt - Deklaration 2015 AC 11 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	32.00
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.6	Toleranz EW = ± 0.5		
Zugabe bitumen	70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	-			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Gasperini AG			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Makies AG Gettnau			
- grobe Gesteinskörnung	Makies AG Gettnau			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	37 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	63 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	135 °C			
- Raumdichte kg/m ³	~ 2376			
- Rohdichte kg/m ³	~ 2462			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	3.5	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	--	≤ 83		
- Stabilität S kN	--	≥ 7.5		
- Fließen F, mm	--	2...4		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	--	---		
- 30000 Prüfzyklen %	--	---		
Wasserempfindlichkeit %	85.4	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	10 32 00	Ja
gültig bis:	30.12.2015	
Konformitätserklärung		Ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0		
	31.5		
	22.4		
	16.0	100.0	
	11.2	98.0	-8/+5
	8.0	80.0	
	5.6	68.0	
	4.0	56.0	± 7
	2.0	37.0	± 6
	1.0	26.0	± 4
	0.5	19.0	
	0.25	14.0	
	0.125	11.0	
	0.063	7.5	± 2

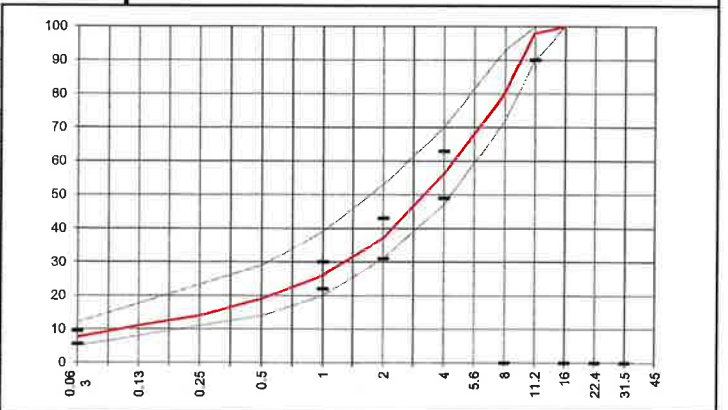

Datum: 01.01.2015
Stempel / Unterschrift
Belagswerk



Datum: 01.01.2015
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor



Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer
